

<b>관리번호</b> 3-3	<b>어촌뉴딜 300사업 추진</b>
--------------------	----------------------

사업구분	계속사업	사업주체	구
사업기간	2020년~2024년	추진상황(%)	추진 중(70%)
소요예산	23,269백만원	완료시기	임기내
추진부서	경제진흥과 해양관리담당 (권오현 ☎4502 오초원 ☎4505)	협조부서(기관)	건축과(김세아 ☎4794) 도시정비과(배철훈 ☎4724)

### 【사업추진계획】

#### □ 사업추진목표(최종목표)

- 노후화된 어항의 기능개선 사업과 주변의 문화·관광 자원을 연계하여 어촌·어항에 새로운 활력을 불어 넣고 하단항·장림항·홍티항으로 이어지는 낙동강 관광벨트 구축, 지역경제 활성화 도모

#### □ 사업개요

구분	하단항 (2020년사업 공모선정)	홍티항 (2021년사업 공모선정)	장림항 (2022년사업 공모선정)
기간	2020년 ~ 2024년(5년간)	2021년 ~ 2024년(4년간)	2022년 ~ 2024년(3년간)
총사업비	<b>7,269백만원</b> (국 3,777, 시 701, 구 1,491, 특교세 1,300) ※ '20년 : 1,225백만원 '21년 : 3,675백만원 '22년 : 2,369백만원 ※ 부지매입비 1,874백만원 (구 574, 특교세 1,300) 포함	<b>9,000백만원</b> (국 6,300 시 918 구 1,782) ※ '21년 : 1,800백만원 '22년 : 3,735백만원 '23년 : 3,465백만원	<b>7,000백만원</b> (국 4,900 시 630 구 1,470) ※ '21년 : 1,050백만원 '22년 : 2,520백만원 '23년 : 3,430백만원
사업내용	· 다목적센터 조성 · 물양장 정비 · 경관사업 · 지역역량강화 등	· 주민 커뮤니티시설 조성 · 어촌화합마당 조성 · 어구창고 조성 · 지역역량강화 등	· 다목적 공동작업장 조성 · 부네치아 문화광장 조성 · 어업인 회관 리모델링 · 지역역량강화 등

□ 세부추진계획

○ 어촌뉴딜 300사업(3개소)

- ▷ 1차년도 : 기본계획 수립 및 고시
- ▷ 2차년도 : 실시설계 추진 및 시행계획 수립
- ▷ 3차년도 : 공사 착공 및 준공, 사업완료

□ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	43%	70%	100%			
하단항	실시설계 완료 및 착공(60%)	공사 착공 및 추진 (80%)	준공 및 사업완료 (100%)			
흥티항	실시설계 완료(55%)	실시설계 완료, 공사 착공(75%)	공사 준공, 사업완료 (100%)			
장림항	기본계획 고시(15%)	실시설계 추진(55%)	실시설계 완료, 착공 및 준공, 사업완료 (100%)			

**【재원조달계획】**

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	23,269	6,699	16,570	7,155	5,632	3,783			
국 비	14,976	3,779	11,197	4,512	3,931	2,754			
시 비	2,250	810	1,440	715	416	309			
구 비	4,743	810	3,933	1,928	1,285	720			
기 타	1,300	1,300							

## 【추진실적】

### □ 하단항

- 2019. 12. : 어촌뉴딜 300사업 대상지 선정(해양수산부)
- 2020. 12. : 기본계획심의(해양수산부) 심의 및 승인
- 2021. 01. : 하단항 어촌뉴딜 300사업 기본계획 고시
- 2021. 02. ~ 06. : 사전행정절차 이행 ▷ 공유재산 심의, 공공건축 심의 등  
역량강화사업 위(수)탁 협약체결(구↔한국농어촌공사)
- 2021. 07. : 실시설계용역 착수 ▷ 2022. 10월 완료
- 2022. 03. ~ 06. : 사전행정절차 이행  
▷ 건축물 경관심의, 간이해역이용협의, 공공디자인 자문회의 등
- 2022. 08. : 계약심사 의뢰(건축, 토목, 전기공사)
- 2022. 11. : 토목공사 착공
- 2022. 12. : 소방·건축·전기·통신공사 착공
- 2023. 01. : 공사 중지(건축·토목·전기·소방·통신)
- 2023. 03. : 공사 재개(건축·토목·전기)
- 2023. 08. : 공사 재개(소방·통신), 공사 중지(토목)
- 2023. 03. ~ 12.: 공사 추진

### □ 흥티항

- 2020. 12. : 어촌뉴딜 300사업 대상지 선정(해양수산부)
- 2021. 03. : 사업 위(수)탁 협약체결(구↔한국농어촌공사)
- 2021. 05. : 기본계획 수립용역 착수
- 2021. 08. : 지역역량강화용역 착수
- 2021. 10. : 기본계획심의(해양수산부) ▷ 조건부승인
- 2021. 12. : 흥티항 어촌뉴딜 300사업 기본계획 고시
- 2022. 02. : 실시설계용역(토목) 착수
- 2022. 03. : 공유재산 관리계획 심의 ▷ 원안가결
- 2022. 04. : 공공건축심의위원회 심의
- 2022. 06. : 실시설계용역(건축) 착수
- 2022. 09. : 간이해역이용협의(→부산지방해양수산청)  
문화재 현상변경허가신청(→문화재청)
- 2022. 11. : 문화재 현상변경 등 허가사항 변경허가 신청(→문화재청)

- 2022. 12. : 공유수면 점용·사용승인 신청(→부산지방해양수산청)  
문화재 현상변경 허가사항 변경허가
- 2023. 01. : 어항 환경정비 공사(준설) 착공
- 2023. 02. : 경관심의 ▷ 원안가결
- 2023. 03. ~ 07. : 실시설계 용역(건축, 토목) 추진
- 2023. 08. : 시행계획 수립 및 고시
- 2023. 10. : 토목/건축공사 착공
- 2023. 12. : 공유재산 관리계획 변경심의(원안가결)

## □ 장림항

- 2021. 03. : 공모사업계획 수립용역 착수
- 2021. 06. : 지역협의체 구성
- 2021. 09. : 2022년 어촌뉴딜 300사업 공모신청 및 부산시평가
- 2021. 10. ~ 11. : 서면 및 현장평가(해양수산부)
- 2021. 12. : 어촌뉴딜 300사업 대상지 선정(해양수산부)
- 2022. 03. : 사업 위(수)탁 협약체결(구↔한국농어촌공사)
- 2022. 05. : 기본계획 수립용역 착수 및 상반기 해수부 현장자문
- 2022. 06. : 장림항 어촌뉴딜 300사업 지역협의체 위원 정비
- 2022. 08. : 하반기 해수부 현장자문
- 2022. 10. : 기본계획 심의 및 지역역량강화용역 발주
- 2022. 11. : 기본계획 심의(조건부 승인)
- 2022. 12. : 기본계획 고시, 지역역량강화용역 착수
- 2023. 04. : 실시설계용역(건축) 착수 ▷ 추진 중
- 2023. 06. : 지역협의체 회의 개최
- 2023. 08. : 장림항 어촌뉴딜 사무장 선발
- 2023. 09. : 실시설계 추진사항 보고회 개최
- 2023. 10. : 주민설명회 개최

## 【문제점 및 대책】

### □ 하단항

- 다목적센터 조성 부지 지반 연약, 지하매설물 간섭 등에 따른 건축물 배치 조정, 건축·토목공사 부지 경계 단차 조율 검토 등으로 인한 공사추진 지연  
▷ 지반개략 공법(골재치환) 통한 지내력 확보 및 건물 배치 조정 후 공사 추진

## 【금후계획】

### □ 하단항

- 2024. 01. ~ 06. : 시설공사 추진 및 준공
- 2024. 06. : 사업완료 및 정산

### □ 흥티항

- 2024. 01. ~ 2024. 12. : 공사 시행 및 준공, 사업완료

### □ 장림항

- 2024. 01. : 실시설계용역 완료, 시행계획 수립 및 고시
- 2024. 03. ~ 12. : 공사 착공 및 준공, 사업완료

## 【구민소통 실적】


설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
7회	1회	2회	-	-

## 【기대효과】

- 어항시설 정비 및 어업환경 개선을 통해 어업인들의 안전하고 쾌적한 어업 활동 공간을 조성하여 기본적인 수산업 활동을 지원하고 어업쇠퇴로 인해 감소한 소득에 대해 어업 외 소득창출 방안을 마련, 어업인 소득증대 도모
- 문화·여가·휴식공간 마련을 통한 지역주민의 삶의 질 향상 및 낙동강 하구 생태환경 등과 연계하여 지속 가능한 관광 콘텐츠 육성



# 【관련사진】

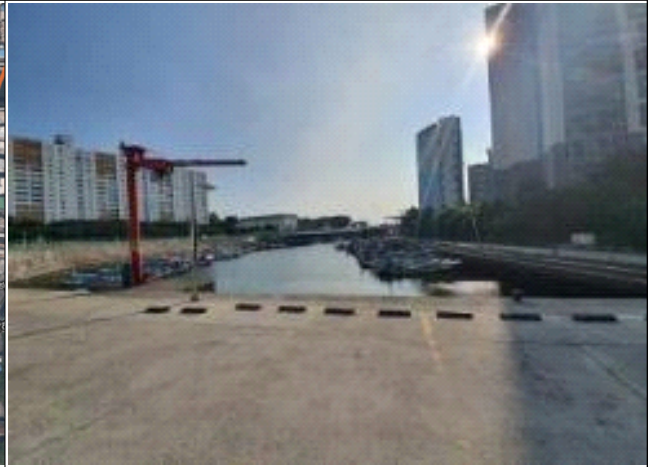

위치도(하단항)

현장사진(하단항)



위치도(홍티항)

현장사진(홍티항)



위치도(장림항)

현장사진(장림항)
